

Ordner 7.5: Bauabfolge 5: Aufbau der Gewölbe-Lagen 1 und 2 um den Backboden



Alle guten Projekte, die eine lange Lebensdauer haben sollen, brauchen einen Kometen!

Hier, zu Beginn des Gewölbeaufbau der Komet, fotografiert von der Terasse zu vorgerückter Stunde



Die erste und zweite Lage um den Backboden bereits schon unter Berücksichtigung des Radius.




dito von innen fotografiert. Die zweite Lage schließt - ungefähr - mit der Oberkante des Sockels für den Tor-Rahmen bzw. Umgebung ab.

Ordner 7.5: Bauabfolge 5: Aufbau der Gewölbe-Lagen 1 und 2 um den Backboden



dito Detail-Aufnahme

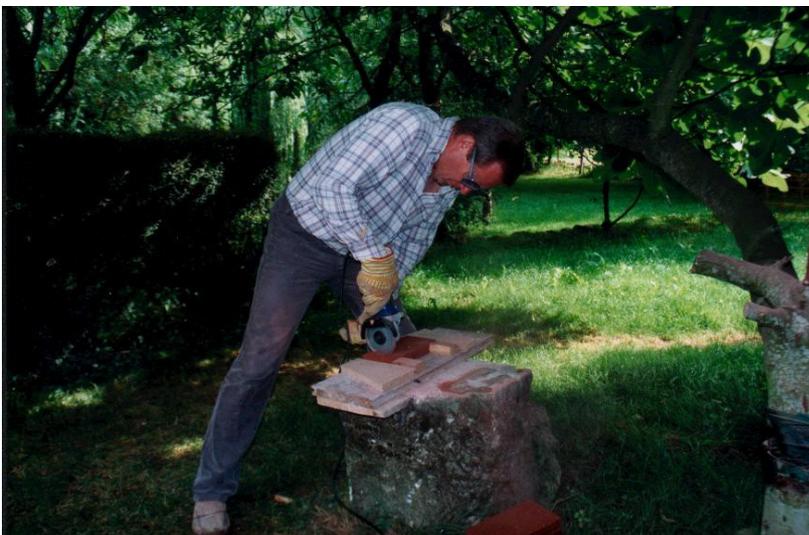

Die Ziegel, 3 cm dick werden mit einer Trennscheibe von Hand geschnitten. Die Platten sind an den Ecken fest eingefaßt. Die Unterlage selber ist auf dem „Tisch“ gegen Verschiebung gesichert. Empfohlen wird dieses nicht ganz ungefährliche Verfahren nicht. Besser und weit ungefährlicher sind fest zu installierende Schneidemaschinen

Ordner 7.5: Bauabfolge 5: Aufbau der Gewölbe-Lagen 1 und 2 um den Backboden

[Zurück zur Startseite](#)
